



La administración de proyectos

WBS - *Work Breakdown Structure*

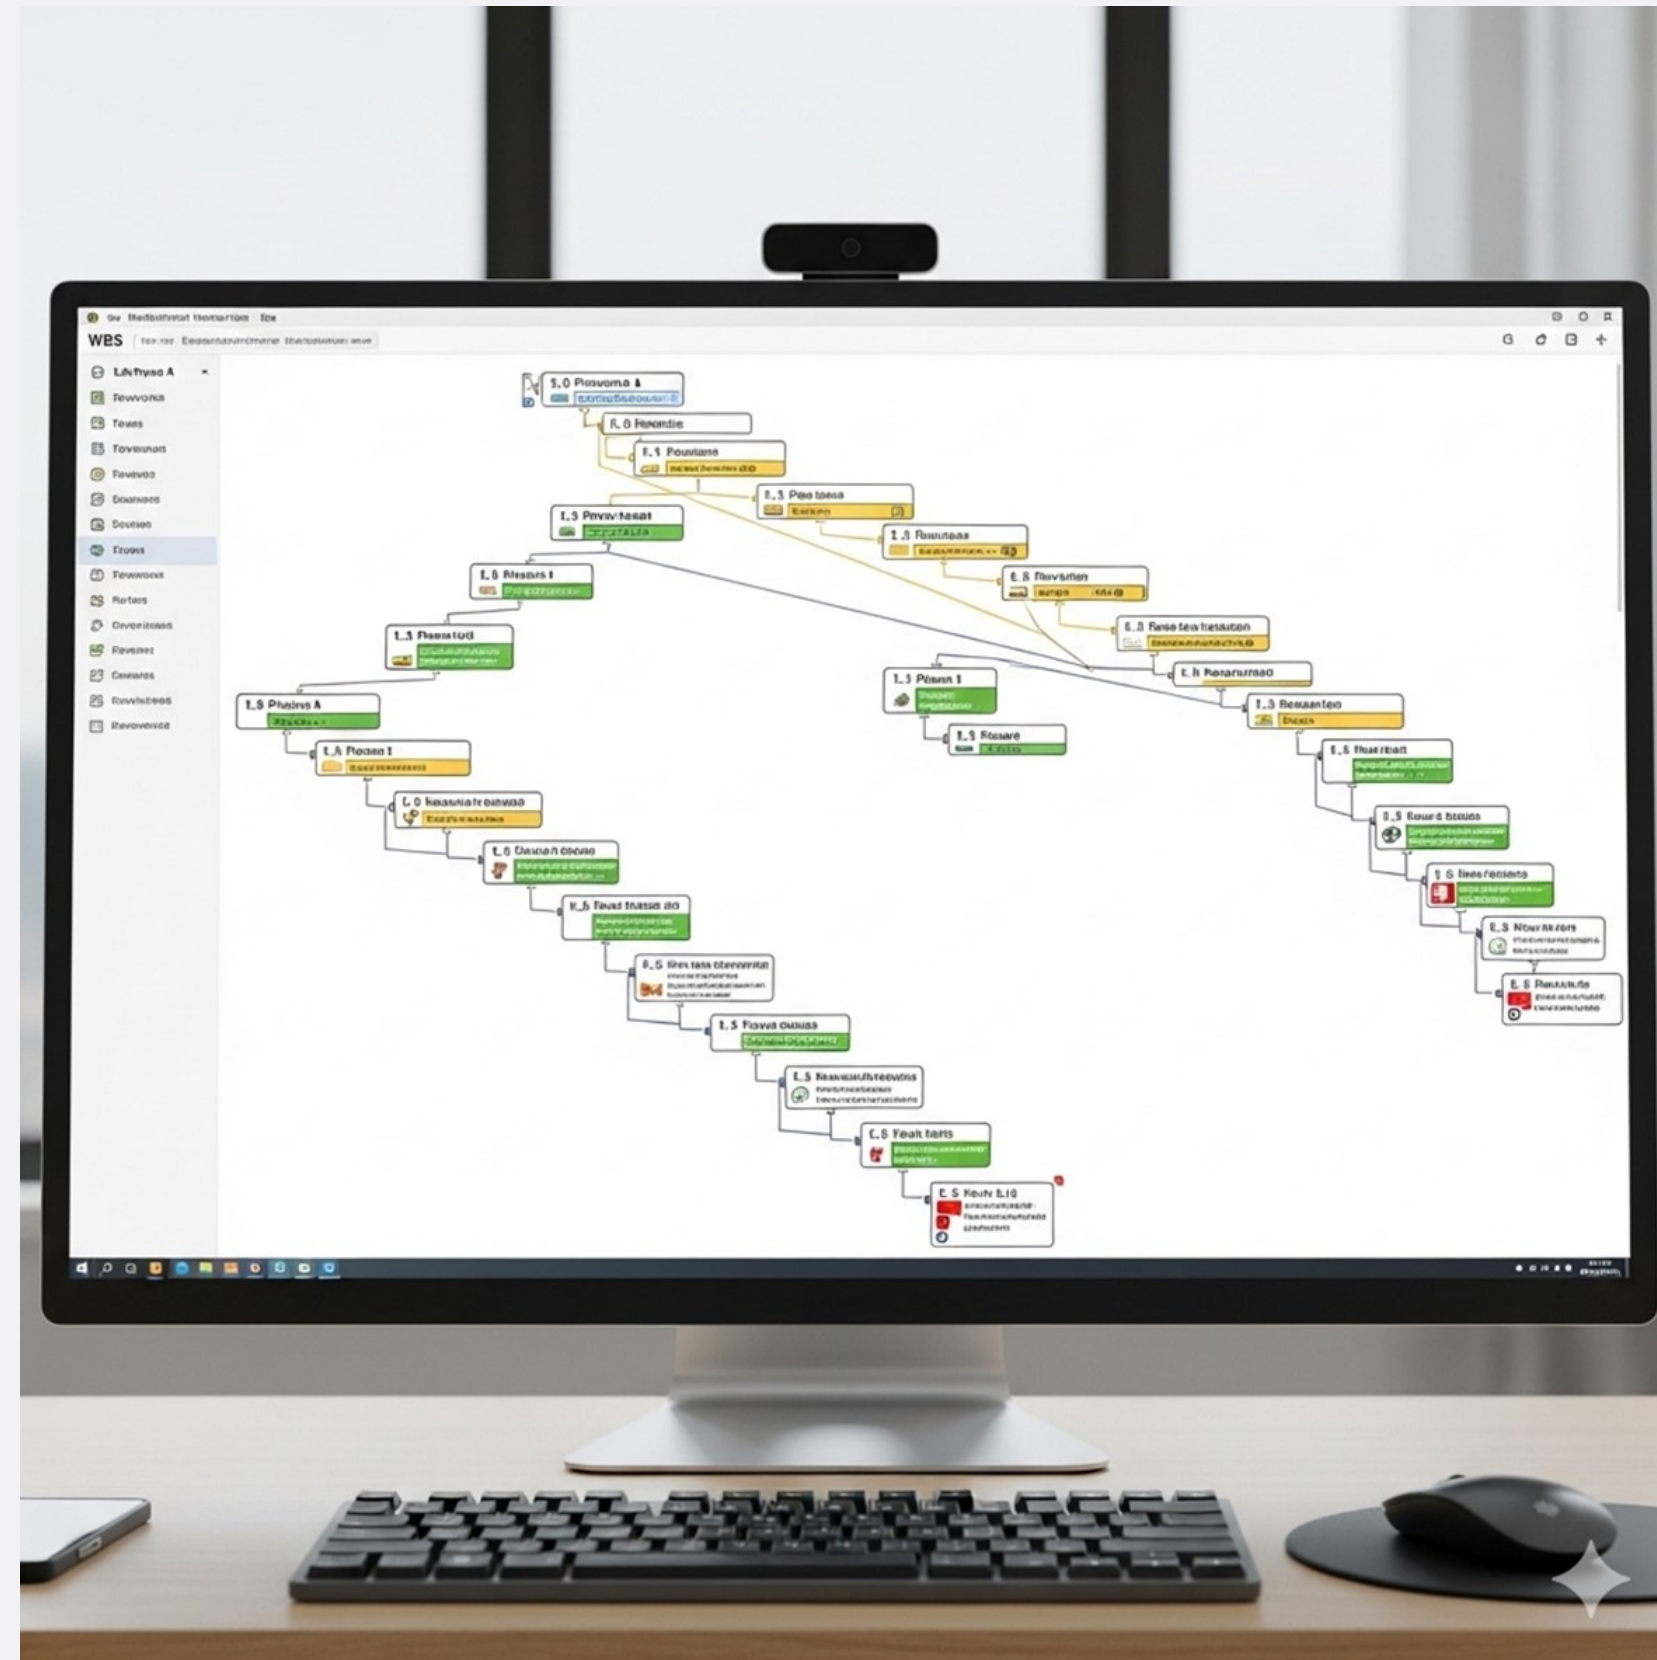

Fuente: elaboración propia con asistencia de inteligencia artificial (DALL-E).


OBS - *Organization B. S.*

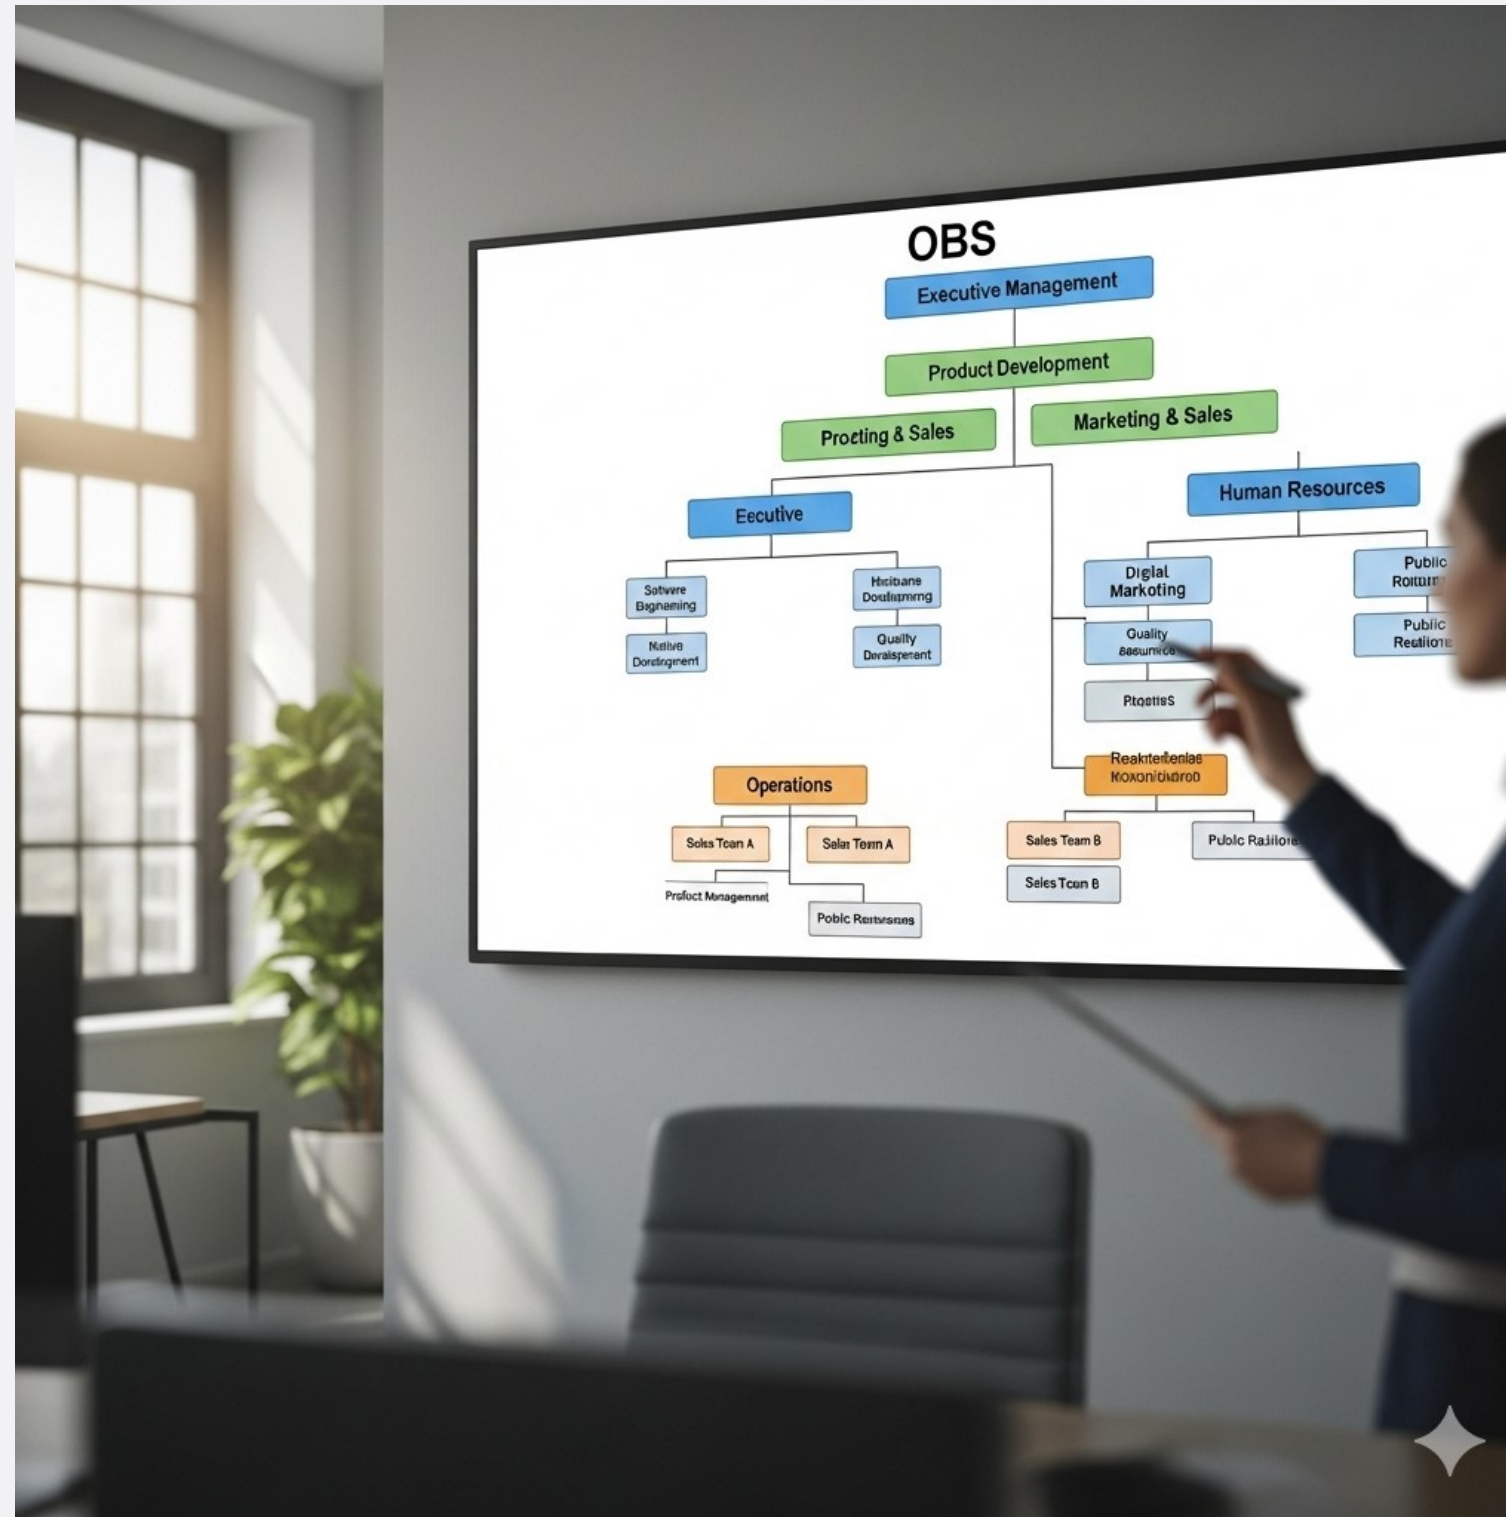

¿Qué es un diagrama de Gantt?

- Es una herramienta gráfica que permite exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades.
- Se puede visualizar el camino crítico del proyecto y permiten reflejar una escala de tiempos para facilitar la asignación de recursos y la determinación del presupuesto.

Diagrama de Gantt

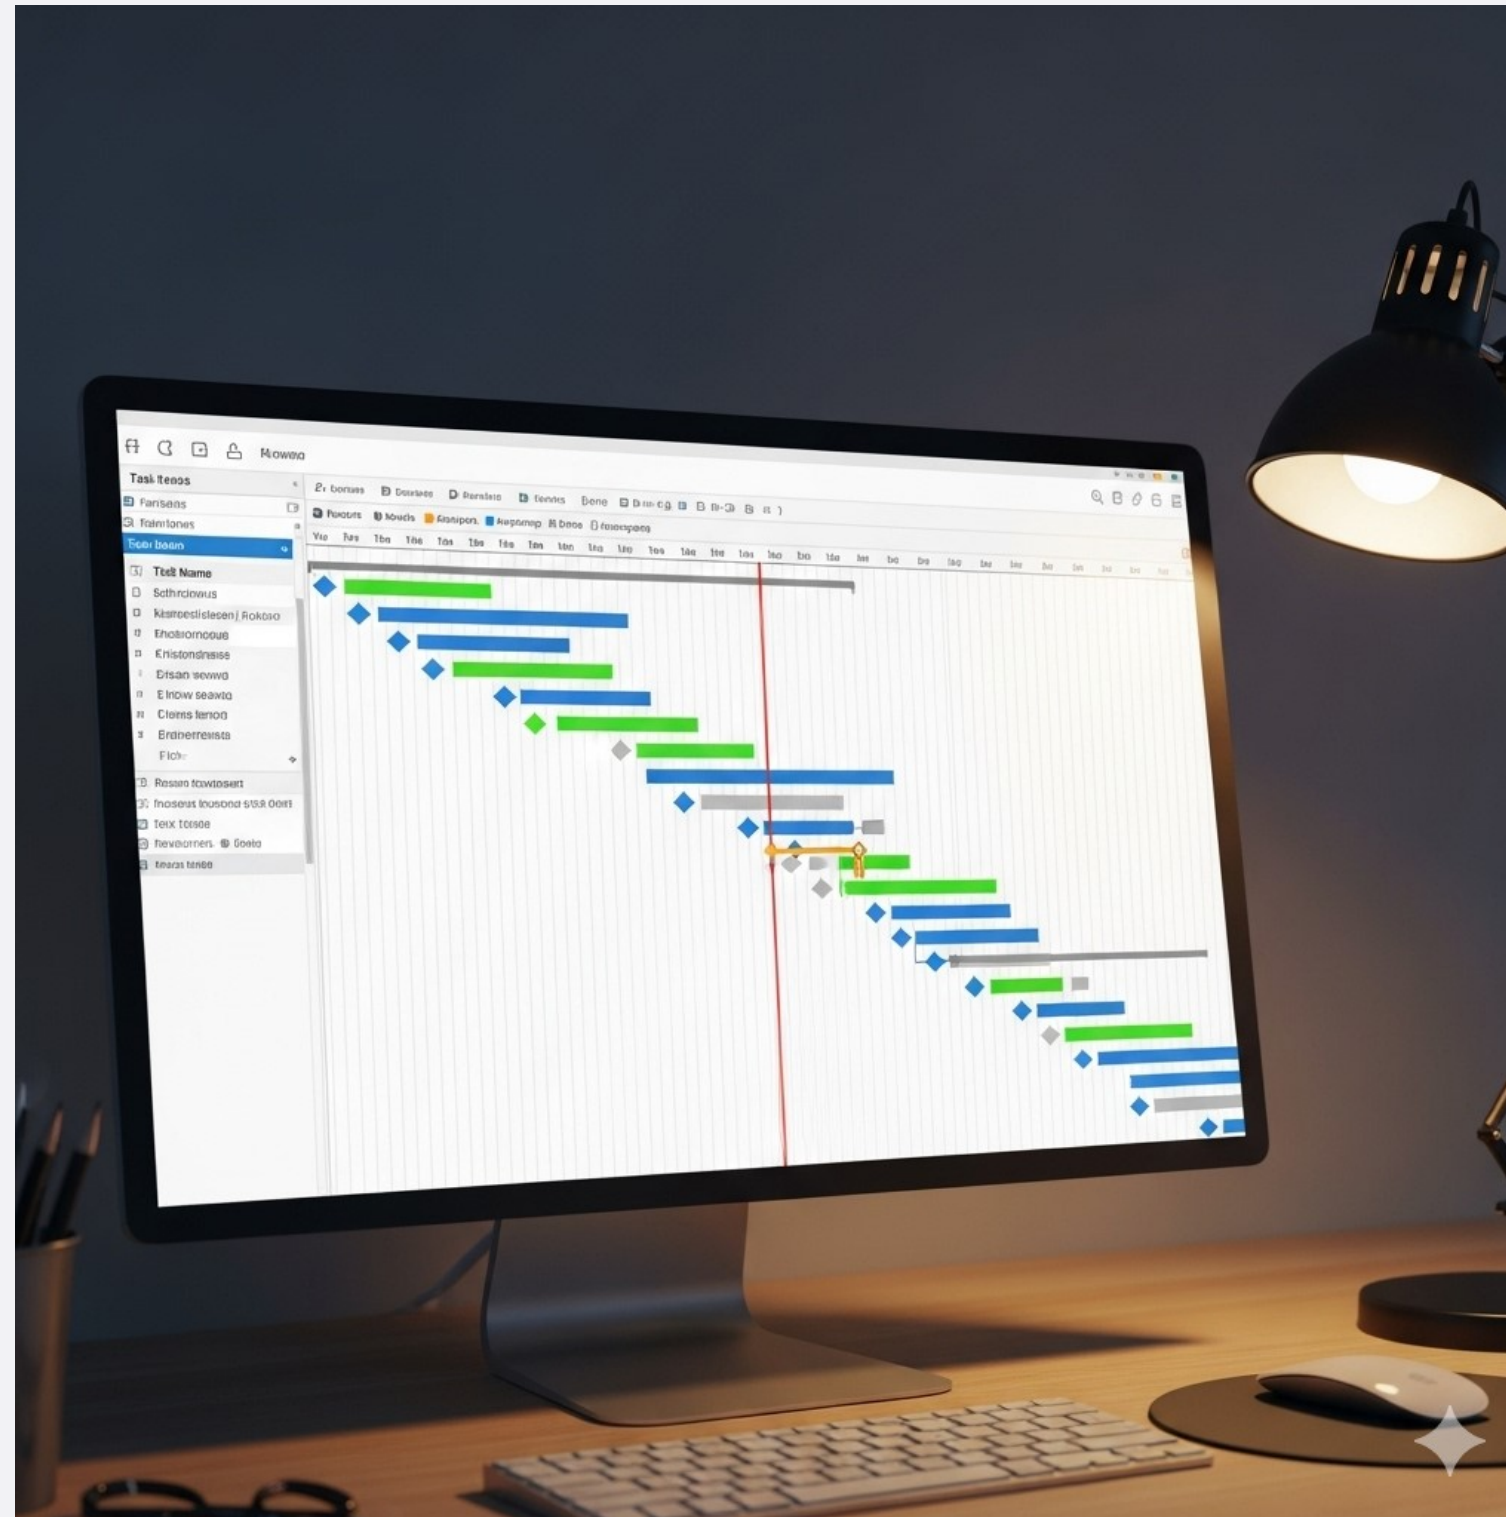

Gestión del cronograma

Recursos	Procesos	Resultados
● Estructura de desglose del trabajo. ● Información histórica. ● Información del calendario del beneficiario. ● Planificación de recursos.	● Planificar-definir la secuencia de actividades y su duración, desarrollar el diagrama de red y el cuadro de Gantt. ● Hacer-comunicar y actualizar el progreso del cronograma. ● Revisar-Monitorear las variaciones del cronograma. ● Adaptar-Actualizar el cronograma para reflejar las nuevas fechas.	● Lineamiento del cronograma del proyecto. ● Reporte de variación del cronograma. ● Actualización del cronograma.

Estimación

Esfuerzo = Tiempo de la persona.

Duración = Días laborables.

Tiempo calendario = combinación esfuerzo y duración.

- **Métricas históricas.**
- **Experiencia personal.**
- **Especialista.**
- **Test de tendencia.**
- **WBS.**

Camino crítico



Camino crítico

- El CC es la secuencia más larga y menos flexible.
- Cualquier retraso en el CC demora el proyecto.
- La única forma de acortar una programación es acortar el CC.
- CC concentra la atención del *management*.

Plan de proyecto



Gestión de riesgos




Fuente: elaboración propia


Gestión de calidad

Gestión de calidad del proyecto		
8.1 Planificación de la calidad	8.2 Aseguramiento de calidad	8.3 Control de calidad
1. Entradas .1 Política de calidad. .2 Declaración de alcance. .3 Descripción del producto. .4 Normas y regulaciones. .5 Otros resultados de procesos. 2. Herramientas y técnicas .1 Análisis costo/beneficio. .2 Benchmarking. .3 Diagrama de flujo. .4 Diseño de experimentos. .5 Costo de calidad. 3. Resultados .1 Plan de gestión de la calidad. .2 Definiciones operacionales. .3 Listas de verificación. .4 Entradas a otros procesos.	1. Entradas .1 Plan de gestión de la calidad. .2 Resultados de las mediciones del control de calidad. .3 Definiciones operacionales. 2. Herramientas y técnicas .1 Herramientas y técnicas de planificación de la calidad. .2 Auditorías de calidad. 3. Resultados .1 Mejoramiento de la calidad.	1. Entradas .1 Resultados del trabajo. .2 Plan de gestión de la calidad. .3 Definiciones operacionales. .4 Listas de verificación. 2. Herramientas y técnicas .1 Inspección. .2 Gráficos de control. .3 Diagrama Pareto. .4 Muestreo estadístico. .5 Diagrama de flujo. .6 Análisis de tendencias. 3. Resultados .1 Mejoramiento de la calidad. .2 Decisiones de aceptación. .3 Repetición del trabajo. .4 Ajustes de los procesos.

Gestión de cambio

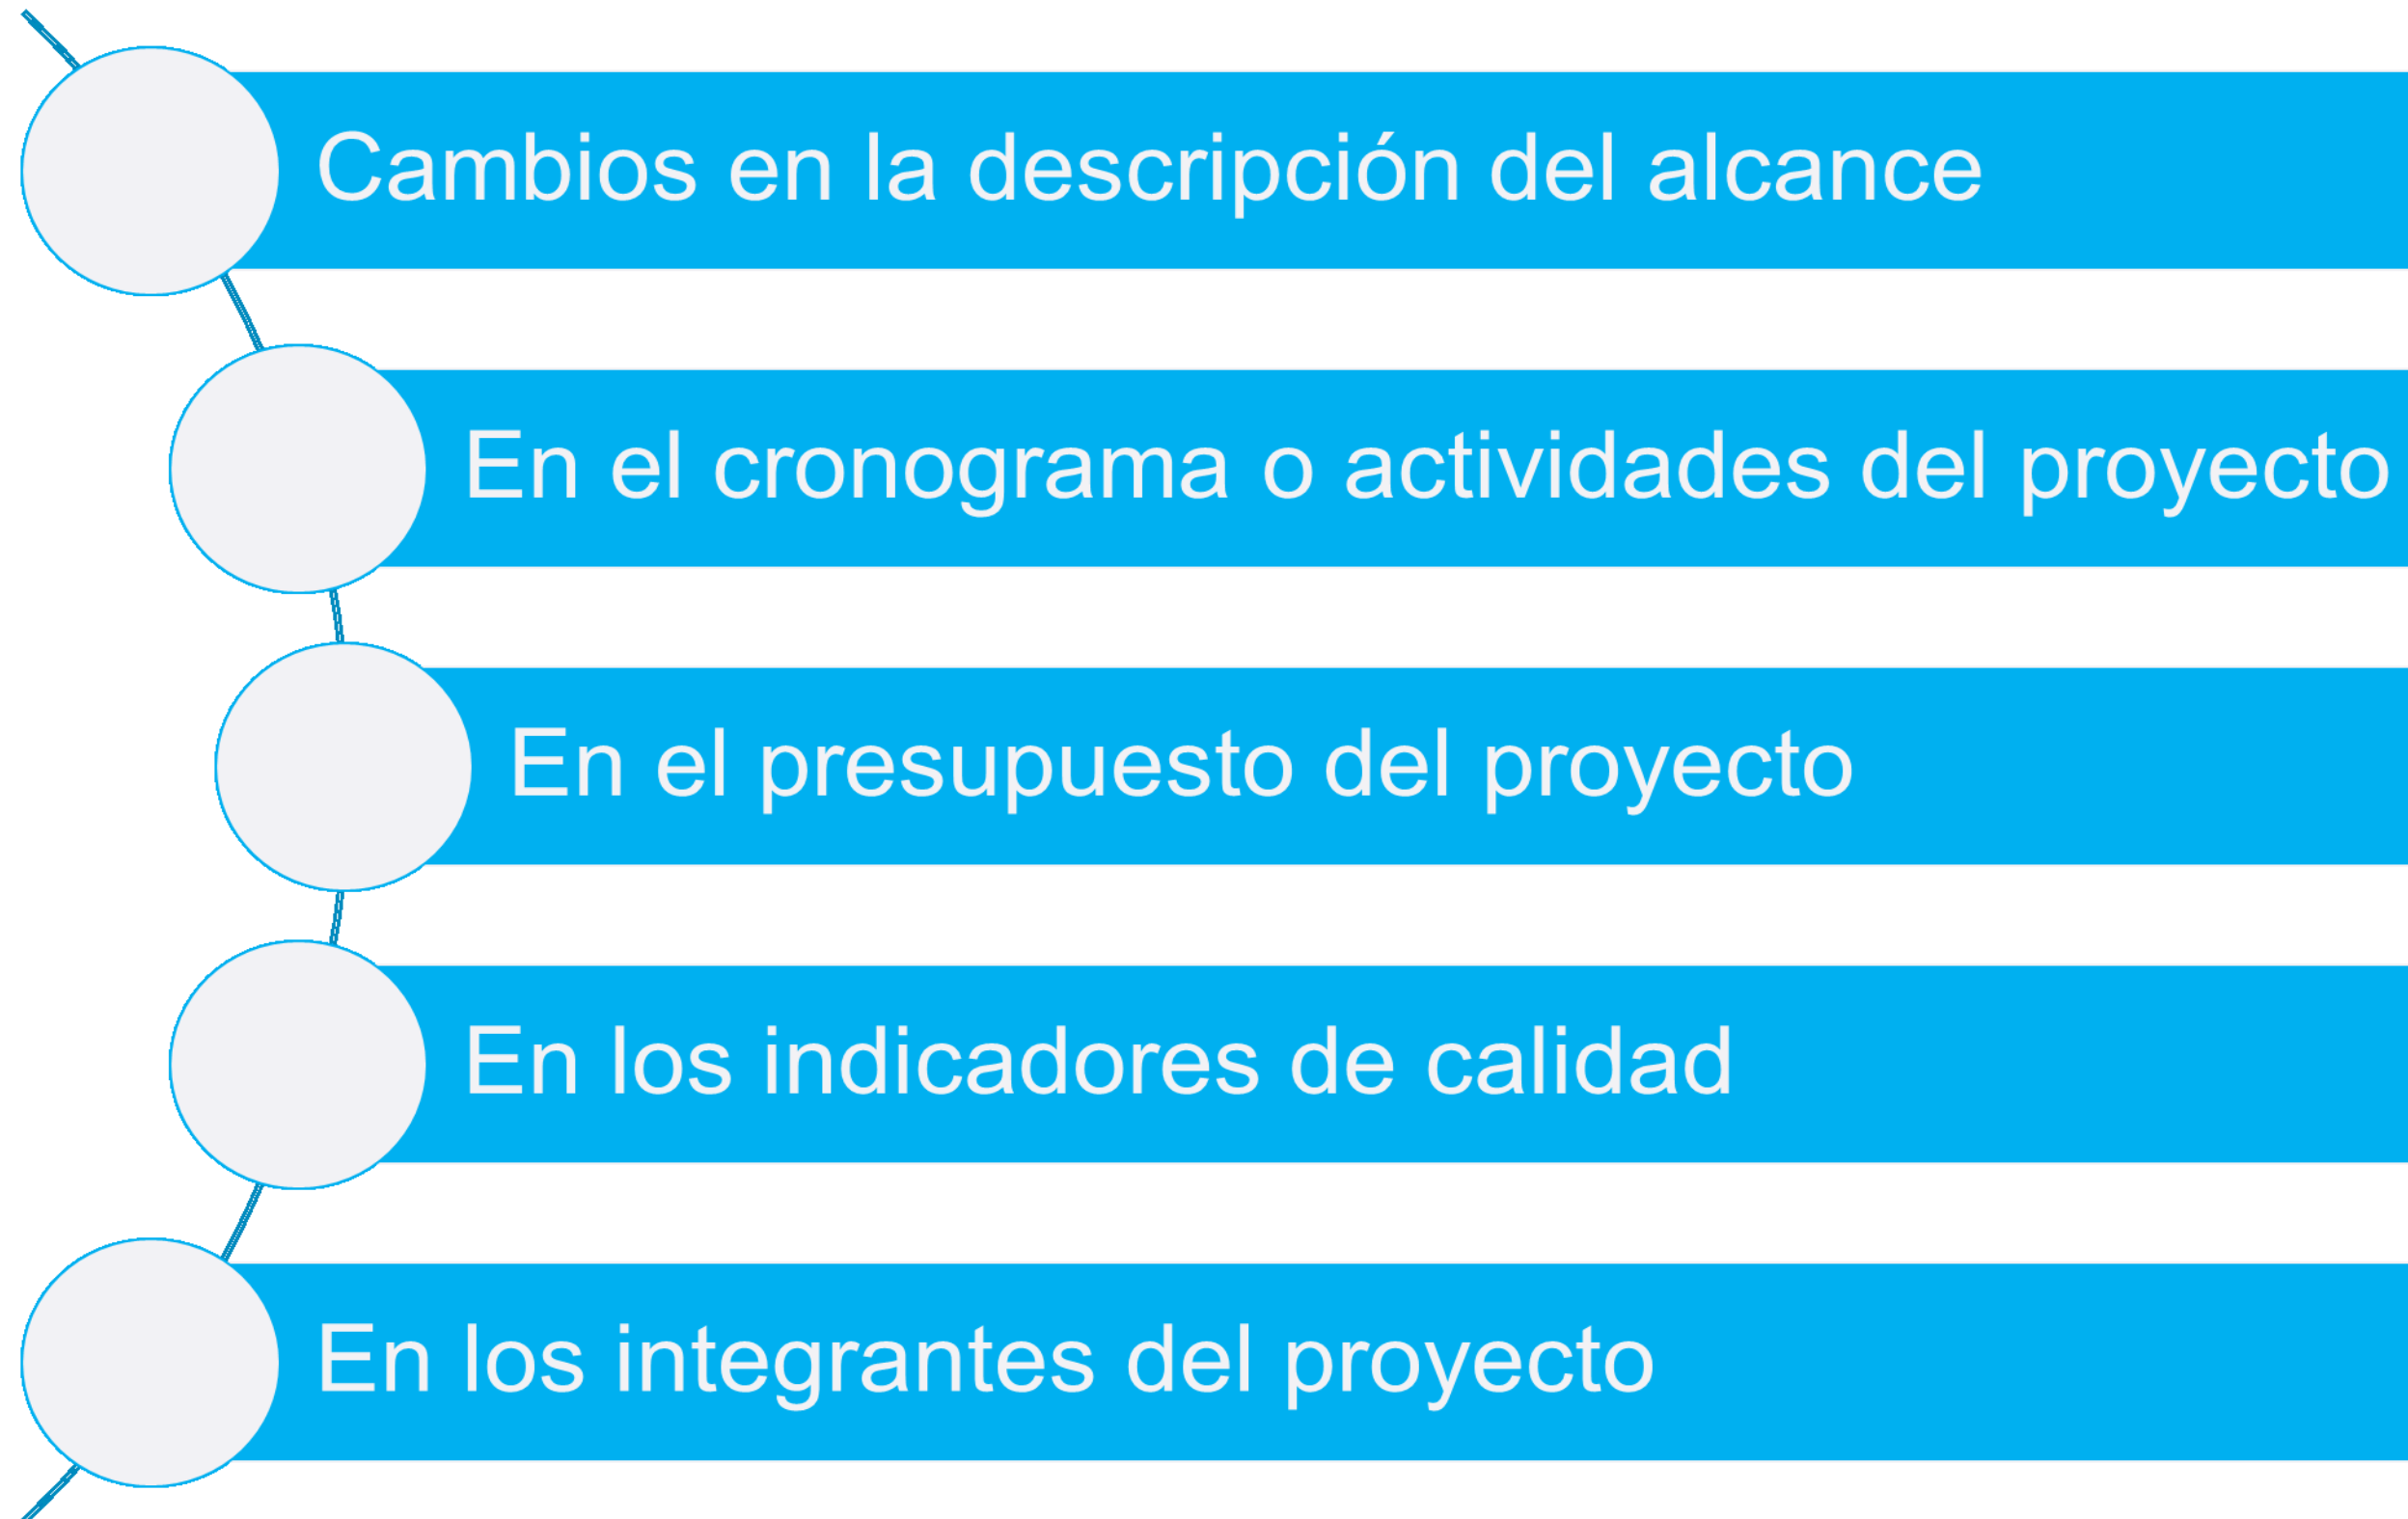

Gestión de cambio

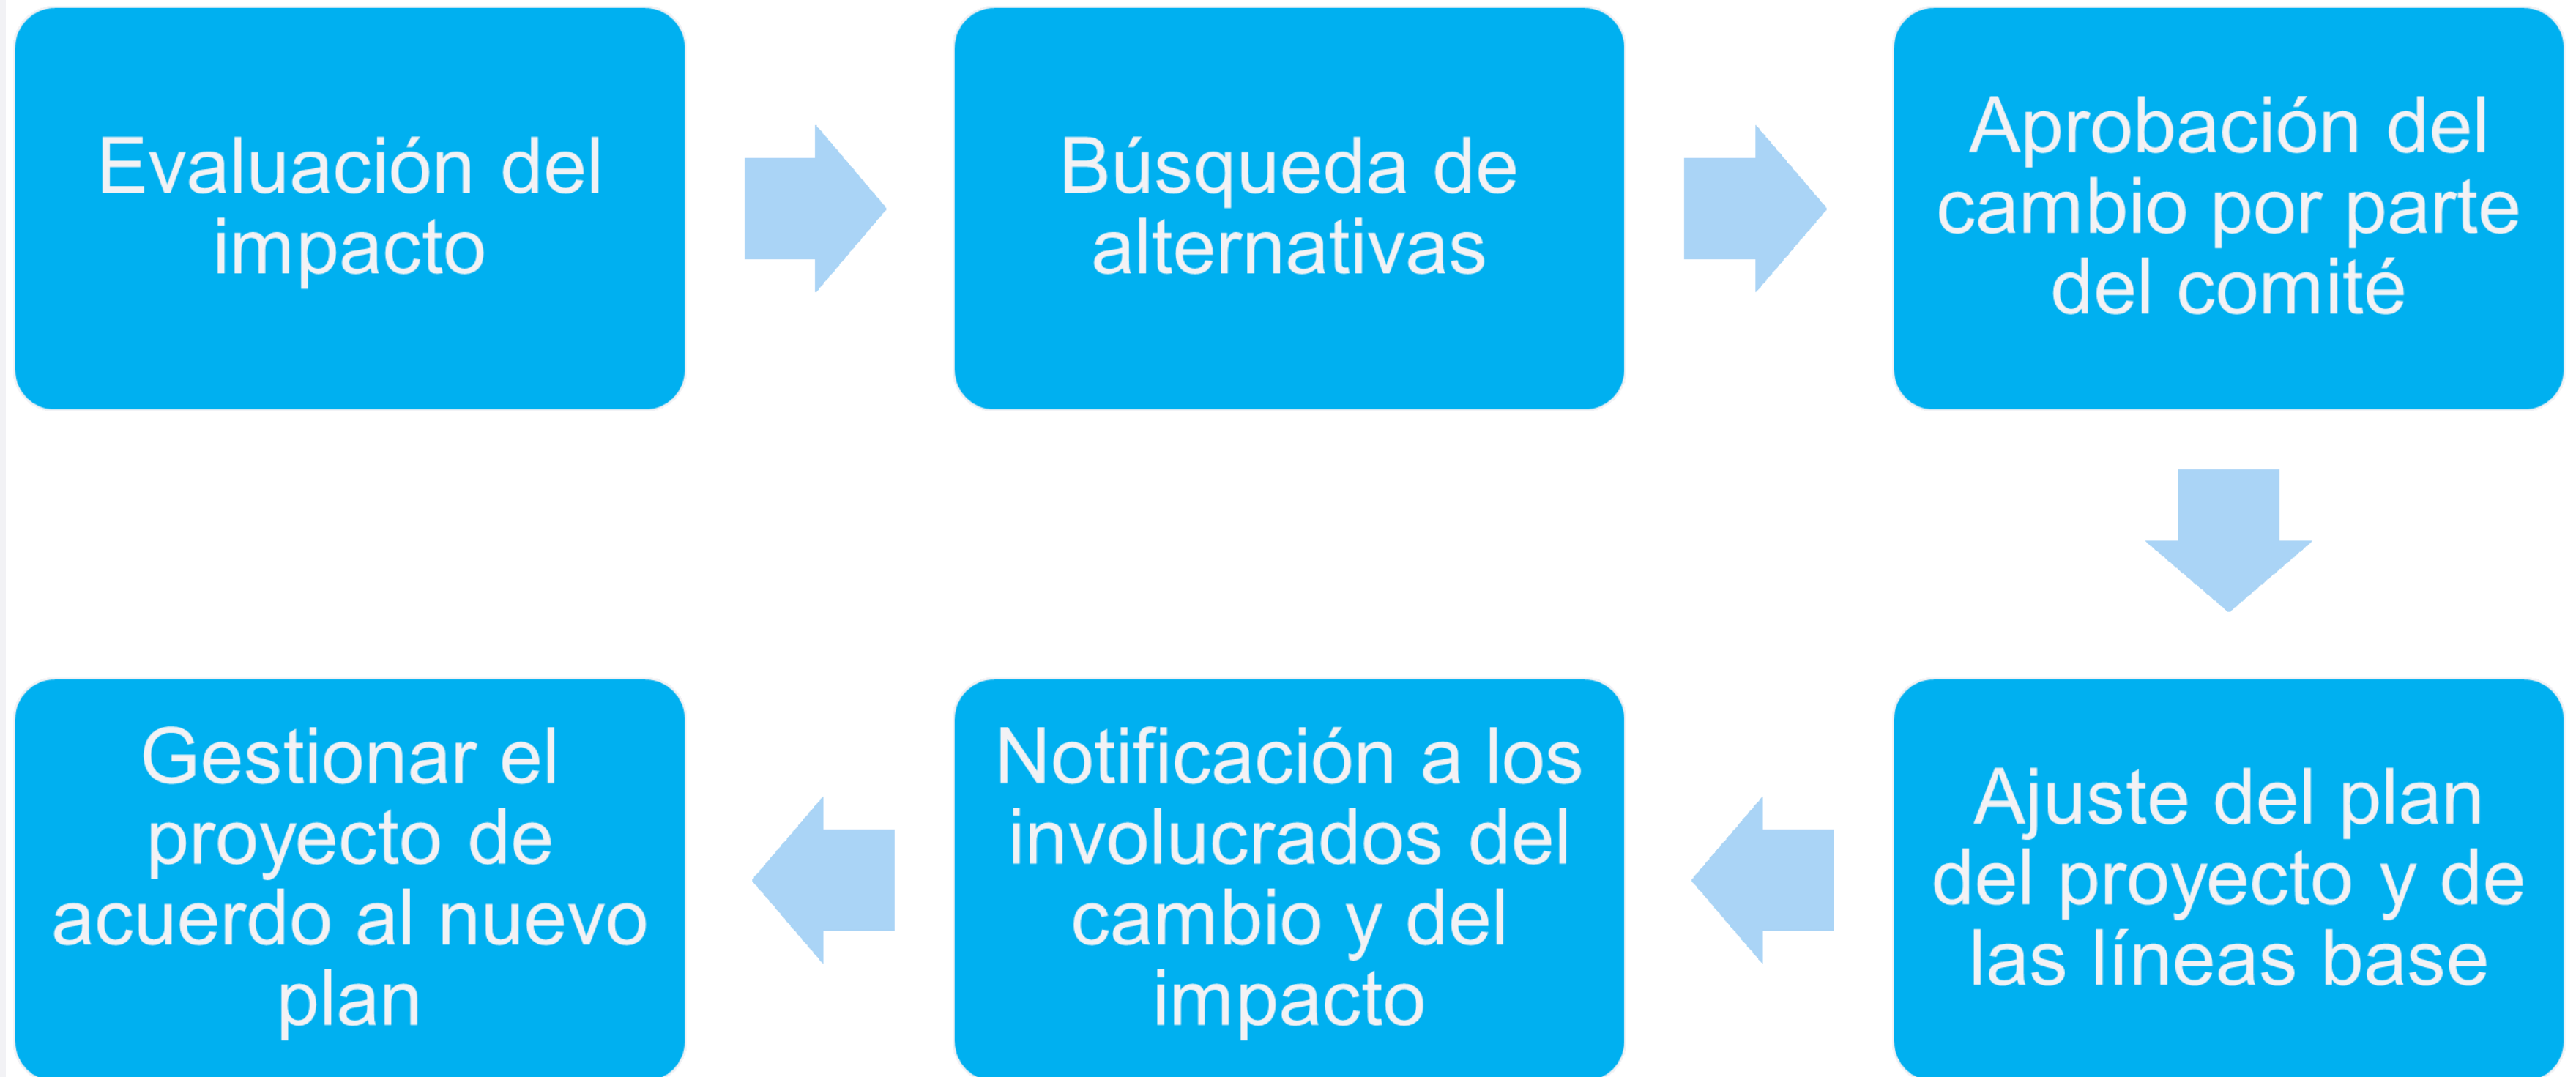

Informe de avance

Resumen ejecutivo

Estado de actividades

Próximas actividades

Riesgos/Problemas

Atrasos

Avances de desembolsos

Tablero de control

Acta de certificación de hitos

HITOS							FECHA		
• Resultado de la Evaluación Hidrológica aprobado							10	11	10
DURACIÓN	146 días								
2da Temporada		FECHA INICIO	12	04	10	FECHA FIN	01	11	10
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD									
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características)									
Cumplimiento de la Ley General del Agua, establecido en el D.S Nº 261-69-AG.									
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN									
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.									
No Aplica									
REFERENCIAS TÉCNICAS									
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable									
No Aplica									
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)									
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable									
Cumplir con las Bases de la Licitación									

ID DEL ENTREGABLE	1.3.2.1.2.1.1		CUENTA DE CONTROL			1.3.2.1.2.1				
NOMBRE DEL ENTREGABLE	2da Temp EstHum Permiso del INRENA									
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO										
Autorización para poder realizar la recolección de especímenes durante el estudio.										
HITOS								FECHA		
• Permiso del INRENA aprobado								29	03	10
DURACIÓN	15 días									
2da Temporada	Estación Húmeda	FECHA INICIO	29	03	10	FECHA FIN	29	03	10	
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD										
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (Normas, características)										
TUPA del INRENA, establecido en el D. S. Nº. 049-2000-AG.										
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN										
Criterios que serán usados para aceptar este entregable.										
Visto bueno del INRENA para poder recolectar especímenes de ser necesario.										
REFERENCIAS TÉCNICAS										
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable										
No Aplica										

Cierre del proyecto

- **Anunciar el fin del proyecto.**
- **Revisión post-implementación.**
- **Completar información.**
- **Reconocimiento y premios.**
- **Ritual de finalización.**



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.
